I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la elaboración y presentación de los informes semanal y mensual de Interventoría para los contratos de obra, relacionados con los siguientes formatos:

MEPI-MN1-IN-15-FR-1:	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría.
MEPI-MN1-IN-15-FR-2:	Resumen Mensual Estado General del Proyecto.
MEPI-MN1-IN-15-FR-3:	Informe Semanal.
MEPI-MN1-IN-15-FR-4:	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra.
MEPI-MN1-IN-15-FR-5:	Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría.
MEPI-MN1-IN-15-FR-6:	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
MEPI-MN1-IN-15-FR-7:	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
MEPI-MN1-IN-15-FR-8:	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra.
MEPI-MN1-IN-15-FR-9:	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría.
MEPI-MN1-IN-15-FR-10:	Estado General del Tiempo.
MEPI-MN1-IN-15-FR-11:	Resumen Ensayos de Laboratorio.
MEPI-MN1-IN-15-FR-12:	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.
MEPI-MN1-IN-15-FR-13:	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría.
MEPI-MN1-IN-15-FR-14:	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra.
MEPI-MN1-IN-15-FR-15:	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica en la elaboración de los informes semanal y mensual de Interventoría para el seguimiento y control de los contratos de obra suscritos por la Entidad.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Interventor. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información y de los valores registrados en los formatos descritos

4. Los documentos deben contener la información correspondiente al avance en la ejecución para los contratos de obra suscritos por el Instituto.

5. El informe semanal corresponde al seguimiento periódico que realiza el Interventor al cumplimiento de la ejecución del contrato de obra.

6. El Informe Mensual debe incluir lo relacionado con el desarrollo de los contratos de obra en el ámbito administrativo, técnico, financiero, presupuestal, jurídico, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y toda la información pertinente que permita conocer el estado y avance mensual de los contratos.

   La Interventoría debe indicar en el informe mensual el avance de las actividades ejecutadas, estado del proyecto e información relevante producida o generada durante el periodo del informe, sin que sea necesario repetir la información de los meses anteriores en el correspondiente mes del informe.

7. La Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones es responsable de la oportunidad y veracidad de la información consignada en los Informes, relacionando las actividades y actuaciones realizadas en el mes.

8. El Interventor debe hacer entrega a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente del Informe Semanal por medio electrónico en Excel y/o en el aplicativo que indique la Entidad, firmado por el Director de Interventoría e incluir su original en el informe mensual.

9. El Interventor debe hacer entrega del informe mensual en medio magnético a la Unidad Ejecutora y una copia a la Dirección Territorial correspondiente con todos los formatos firmados por los responsables.

10. Los formatos se deben diligenciar de manera clara y legible en letra Arial 11 al 100% (Sin reducir su tamaño).

11. La presentación completa del Informe mensual por parte del Interventor, es requisito indispensable para la autorización del pago de los costos de Interventoría correspondientes.

12. La numeración de los informes mensuales debe ser consecutiva y coincidir con la numeración y mes del período facturado.

13. El Interventor debe verificar en la lista de chequeo que los folios indicados correspondan con los folios propios del informe.

14. La presentación de los documentos que hacen parte del informe mensual debe hacerse en el mismo orden de la lista de chequeo, indicando los respectivos folios.

15. Los informes mensuales deben elaborarse teniendo en cuenta lo establecido en la Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría formato MEPI-MN1-IN-15-FR-1. Este formato debe corresponder a la primera página del informe. La segunda página del informe corresponde al Resumen Mensual Estado General del Proyecto Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

16. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. INFORME SEMANAL FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

1. La numeración del Informe semanal debe ser consecutiva a partir de la orden de inicio de ejecución del contrato, teniendo como fecha de corte el día jueves.

2. El Interventor debe realizar el seguimiento semanal al programa de obra aprobado verificando la consistencia entre la obra ejecutada en relación con el programa de inversiones y el alcance establecido en los documentos contractuales.

3. Es responsabilidad exclusiva de la Interventoría mantener informado al Instituto sobre el avance en la ejecución de las obras, indicando las metas físicas ejecutadas y actualizando las metas físicas acumuladas, así como el avance financiero en el informe semanal.

4. El Informe Semanal debe ser suscrito por el Director de Interventoría y contener la información del avance de la semana en forma resumida para los siguientes aspectos:

   I. INFORMACIÓN GENERAL

   En la casilla “Descripción breve características técnicas generales de la obra”: El Interventor debe indicar tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes, obras de arte, placa huella, entre otros, así como los kilómetros a intervenir para modo carretero.

   Para otros modos de transporte el Interventor debe indicar las características técnicas de la obra a ejecutar.

   II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

   En este numeral el Interventor debe hacer seguimiento e informar el avance presupuestal, financiero, y la inversión del anticipo para el contrato de obra y el contrato de interventoría.

   El Interventor debe hacer seguimiento a la relación de la ejecución del contrato de la interventoría frente a la ejecución del contrato de obra para lo cual determina el indicador I/C: “C” representa la inversión total ejecutada en obra. “I” corresponde a la inversión total ejecutada en interventoría.

   Cuando la Interventoría controle más de un contrato de obra, la relación debe calcularse por separado para cada uno de ellos, para este efecto, el costo total de la Interventoría debe distribuirse para cada contrato de obra de acuerdo con su ejecución y lo pactado en el contrato de interventoría.

   III. AVANCE FÍSICO

   El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente. Se debe incluir la información por tramo y/o sector.

   Cuando se trate de puentes o viaductos el Interventor debe indicar el avance para cada uno de sus componentes (cimentación, infraestructura, superestructura, accesos y otros).

Cuando se trate de túneles el Interventor debe indicar el avance para cada uno de las actividades representativas (Excavación, drenajes, revestimiento, equipos electromecánicos, etc.).

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

V. GESTIÓN SOCIAL

VI. GESTIÓN PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El Interventor debe registrar el avance de la semana para cada una de las metas identificando la localización y las actividades ejecutadas; así como indicar el avance acumulado de cada una de las metas.

Ejemplo:

Construcción Ruta X:
Se instala material de primera y cuarta capa de terraplén del PRXX+XXX al PR XX+XXXX
Se instala Base Tratada con Asfalto del PRXX+XXXX al PRXX+XXXX
Instalación de MDC-19 modificada con polímeros tipo III del PRXX+XXXX hacia menores.
Se realiza excavación, fundida de solado e instalación de tubería de alcantarilla PRXX+XXXX y
Se realiza armado de formaletas para placa superior del Box del PRXX+XXXX
Se realiza armado de acero del Box del PRXX+XXXX

Volumen acumulado MDC19-T3: Longitud acumulada construcción: XX Km (PRXX+XXXX al PRXX+XXXX).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El Interventor debe identificar con el Contratista las actividades a realizar en la siguiente semana conforme a lo establecido en el Programa de Obra aprobado.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El Interventor en este numeral debe representar un esquema gráfico de las metas físicas según:

Metas físicas programadas: Representación gráfica de los sectores en los cuales se tiene programado ejecutar las actividades, de acuerdo con el programa de obra.

Metas físicas ejecutadas: Representación gráfica de la obra ejecutada acumulada de acuerdo con la meta física del contrato.

Ejemplo de plantilla:

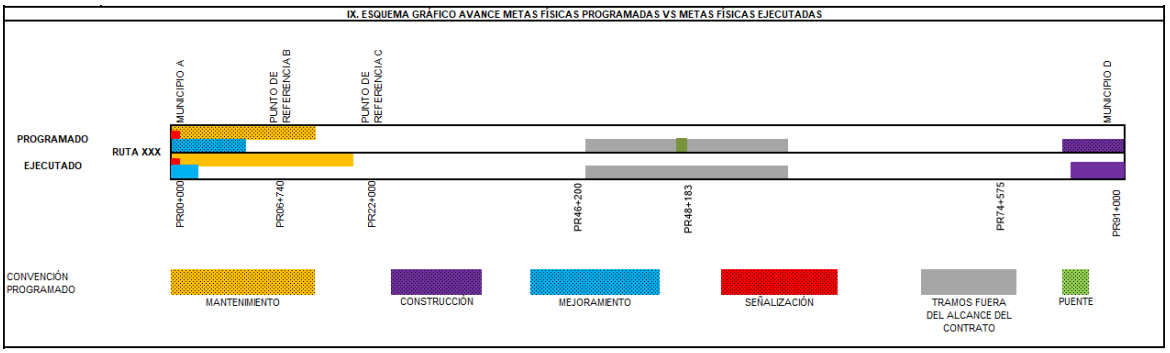

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

El Interventor debe adjuntar fotografías representativas del avance en la ejecución de la semana, debe realizar la comparación que muestre el avance del proyecto (fotos antes – durante – después, máximo seis (6)), recomendando que sean tomadas desde el mismo sitio.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

En este numeral el Interventor debe informar de manera clara, precisa y resumida las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra y las situaciones más relevantes en la ejecución del contrato incluida la gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad.

5. El Interventor debe diligenciar semanalmente los formatos digitales de los aplicativos que requiera el INVIAS para realizar el seguimiento de la ejecución del proyecto.

6. El Contratista y el Interventor deben evaluar semanalmente la ejecución del contrato, verificando el debido cumplimiento de la ejecución contra el Programa de Obra y el Programa de Inversiones vigentes. El resultado de dicha verificación debe reportarse en el Informe Semanal de Interventoría.

7. Cuando se presenten incumplimientos en las obligaciones contractuales por parte del Contratista, es responsabilidad del Interventor solicitar por escrito el inicio de un proceso por incumplimiento diligenciando los formatos ALEDEJ-FR-5 “Lista de chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio -P.A.S.-” y ALEDEJ-FR-6 “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando los documentos soportes e indicando el valor estimado de la multa o sanción.

V. CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL FORMATOS MEPI-MN1-IN-15-FR-1 AL MEPI-MN1-IN-15-FR-15

CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

El informe mensual inicia con los siguientes formatos:

- Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-1**, corresponde a la página uno (1) del informe.

- Resumen Mensual Estado General del Proyecto. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-2**. En el cual el Interventor registra de manera resumida el estado general de ejecución del contrato. Este formato corresponde a la página dos (2) del informe.

A continuación debe cumplir con la siguiente estructura:

1. **Introducción**: Debe contener el número de los procesos de selección contratos de obra y de interventoría, el número ID del SECOP para los contratos de obra y de interventoría, la información del programa o plan de gobierno por el cual fue contratado y una breve descripción del objeto a ejecutar. Así mismo, debe indicar los nombres del Supervisor del Contrato de Interventoría, el Gestor Técnico y Gestores Ambiental, Social, Predial y de Sostenibilidad cuando sea del caso, con sus correspondientes actos administrativos de designación.

2. **Descripción del proyecto**: Resumen ejecutivo que contenga lo siguiente:

   2.1. Localización (incluyendo esquema claro y completo de ubicación del sector, tales como campamentos, fuentes de materiales, etc.).

   2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

   2.3. Inventario y estado inicial de la vía. El interventor debe informar el estado inicial de la vía y adjuntar fotografías representativas del sector, en el mismo sitio donde fueron tomadas mes a mes debe realizar la comparación con fotografías actualizadas que muestren el avance del proyecto (Fotografías antes – durante – después, máximo cuatro hojas).

   Las fotos deben corresponder al mes de ejecución.

Foto Inicial (Indicar PR y fecha)	Foto Avance (Indicar PR y fecha)

   2.4. Características técnicas del proyecto (parámetros de diseño, parámetros geométricos, sección típica de la vía, estructura del pavimento a construir y tipificación de los diferentes sectores).

3. Información Contrato de obra.

3.1. Información general del contrato. Se debe relacionar el número del proceso de selección, número ID del SECOP, número del contrato, fecha de suscripción, objeto, Contratista, NIT, (indicar integrantes, NIT y porcentajes de participación de cada uno cuando se trate de consorcio o unión temporal), valor inicial, adiciones, valor acumulado del contrato, modificaciones, aclaraciones, suspensiones, cesiones de participación contractual, plazo, fecha de inicio, fecha de terminación actual del contrato, dirección y número de teléfono.

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes. Dentro del informe mensual el Interventor debe realizar la descripción de las actividades ejecutadas en el mes; el Interventor debe informar el avance en la ejecución del mes, reportando las actividades desarrolladas por parte del Contratista.

La Interventoría debe indicar en el informe mensual el avance de las actividades ejecutadas, estado del proyecto e información relevante producida o generada durante el periodo del informe, sin que sea necesario repetir la información de los meses anteriores en el correspondiente mes del informe.

Incluir un resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la gestión ambiental, social, predial y de sostenibilidad realizada en el mes, contemplando que para estos componentes el Interventor debe presentar el informe de avance a la Subdirección de Sostenibilidad con la periodicidad y el alcance indicado en los instructivos para su aprobación.

El Interventor debe llevar un control de los valores discriminados para la ejecución del contrato, indicando el valor ejecutado y el saldo de los recursos asignados para cada una de las actividades.

En caso de que los valores en la propuesta económica aprobada se establezcan para varias actividades, provisiones y gestiones, la Interventoría debe llevar el control de la inversión y de los saldos para cada una, discriminando el valor básico y el IVA correspondiente.

Ejemplo:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (Según última acta de modificación)	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS	1000	1300	200	1100	100
PROVISIÓN	200	200	50	120	80
IVA					
ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS					
GESTIÓN SOCIAL					
GESTIÓN PREDIAL					
GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE PAGA)					
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD					
OTROS					
VALOR TOTAL					

3.3. Seguimiento Ítems no previstos. En el evento de haberse tramitado y aprobado ítems no previstos el Interventor debe indicar el número y fecha del Acta de Fijación de Ítems no Previstos incluyendo la información de estos ítems durante la ejecución del contrato según el siguiente cuadro:

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. _____ DE FECHA _____								
ÍTEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No.___DE FECHA_____	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS

El Interventor debe realizar el seguimiento y control a las cantidades ejecutadas acumuladas de acuerdo con el acta de modificación aprobada según el Acta de Fijación de Precios no Previstos y en caso de ser mayor a las aprobadas inicialmente, debe justificar de manera detallada las razones del incremento en las cantidades.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. El Interventor debe indicar en el informe el estado y las acciones a seguir en cada mes frente al avance de la obra e inversión programada vigente. Relacionar las actividades ejecutadas en el mes frente a lo programado y mencionar las acciones a seguir por parte de la Interventoría.

4. Reportes ejecución mensual contrato de obra:

El Interventor debe anexar al informe los siguientes formatos diligenciados y suscritos por los responsables:

4.1 Informe semanal**.** Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-3.** El Interventor debe adjuntar el original de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes, los cuales deben estar firmados por el Director de interventoría (informes presentados los días jueves). El informe semanal corresponde al seguimiento periódico que realiza el Interventor al cumplimiento de la ejecución del contrato de obra.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-4**. En el cual el Interventor lleva el registro diario de maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras y verifica el cumplimiento y estado del equipo mínimo exigido en el pliego de condiciones (A=Activo, R= En reparación, I= Inactivo).

Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.

Es responsabilidad de la Interventoría presentar la justificación del estado de la maquinaria y equipo que se encuentre en reparación o inactiva.

El Interventor debe verificar que la maquinaria y equipo se encuentren dispuestos en obra, dejando todas las aclaraciones y evidencias de su utilización, presentando las observaciones necesarias en cuanto a la disponibilidad, con el fin de mantener indemne al Instituto frente a una posible reclamación del Contratista.

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-6**. En el cual el Interventor verifica el personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones y deja constancia de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal, de tal forma que se mantenga indemne al Instituto frente a cualquier posible reclamación.

Igualmente el Interventor verifica el pago de los aportes legales y de seguridad social efectuados por el Contratista en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica de acuerdo con la normatividad vigente, cuando aplique.

Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato, así como del cumplimiento de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad

social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-8.** En el cual el Interventor debe llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del proyecto, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

El Interventor debe revisar mensualmente el reporte del SIIF NACION, con el fin de verificar los pagos efectuados de las actas tramitadas; información que debe solicitar el Interventor al Gestor Técnico de Proyecto o al Supervisor del Contrato de Interventoría.

4.5 Estado general del tiempo. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-10**. En el cual el Interventor lleva el registro diario del estado general del tiempo; debe indicar en cada casilla el número de horas por día señalando la clase de tiempo: Seco, lluvias moderadas, lluvias intensas.

El Interventor debe diligenciar en observaciones, las aclaraciones y evidencias que mantengan indemne al Instituto frente a cualquier posible reclamación del Contratista.

Se debe anexar el registro pluviométrico del IDEAM actualizado, correspondiente a la estación o estaciones más cercanas al sitio de las obras.

4.6 Resumen ensayos de Laboratorio. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-11**. En el cual el Interventor registra los resultados de los ensayos de laboratorio requeridos para verificar que las obras ejecutadas cumplan con las especificaciones de construcción y las normas de ensayo correspondientes

La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben ser anexos al informe mensual.

El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el Contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-12**. En el cual el Interventor realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y verifica la aprobación de las mismas por parte de la Entidad en la plataforma del SECOP.
El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad del Contrato de Obra. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-14.** En el cual el Interventor realiza el seguimiento y verifica el cumplimiento mensual del Plan de Calidad del Contrato de Obra y toma las acciones correctivas en el caso contrario.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento a la inversión del Anticipo. En el informe se debe incluir copia del Plan de Inversión del anticipo mensualizado (Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1), el Interventor debe registrar los movimientos detallados de la utilización del anticipo controlando su saldo mensual y el reintegro de los rendimientos causados, registrando en el formato los generados en el mes anterior al mes del informe (Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2).

  El Interventor debe presentar en sus Informes mensuales los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

- Seguimiento Programa de Obra. El Interventor debe presentar el Programa de Obra con el corte de avance correspondiente a la fecha de corte del informe mensual en Project o programa similar.

- Seguimiento Programa de Inversiones. Se debe anexar copia del Programa de Inversiones aprobado vigente (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1) y copia del documento de seguimiento al Programa de Obra e Inversiones realizado por la Interventoría (Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2).

- Actas de Comité de Obra (Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1)

- Actas de Reunión (Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2).

5. Información Contrato de Interventoría

El Interventor debe incluir la siguiente información:

5.1. Información general del contrato. Se debe relacionar el número del proceso de selección, número ID del SECOP, número del contrato, fecha de suscripción, objeto, Contratista, NIT, (indicar integrantes, NIT y porcentajes de participación de cada uno cuando se trate de consorcio o unión temporal), valor inicial, adiciones, valor acumulado del contrato, modificaciones, aclaraciones, suspensiones, cesiones de participación contractual, plazo, fecha de inicio, fecha de terminación actual del contrato, dirección y número de teléfono.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

5.3. Informes especialistas y profesionales. Informe ejecutivo de los profesionales y especialistas que sean utilizados durante el mes, en el cual debe relacionar las actividades y recomendaciones dirigidas por éstos a la interventoría.

Los informes deben presentarse de manera detallada por escrito y debidamente firmados, indicando especialidad y número de matrícula profesional o equivalente.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja - PAC. El Interventor debe presentar la programación mensual de los recursos a ejecutar para el contrato de obra y para el contrato de interventoría, y comparar esta programación con la ejecución mensual ejecutada para dichos contratos.

5.5. Informe matriz de riesgos. El Interventor debe evaluar, monitorear y presentar un informe del seguimiento a los tratamientos y controles de cada uno de los riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato de obra y proponer al Instituto, si fuere del caso, mejoras a los tratamientos y controles previstos en la matriz con la finalidad de evitar la ocurrencia de los eventos.

En caso de materializarse alguno de los riesgos previstos en la matriz, el Interventor debe incluir en el informe mensual las actividades desarrolladas para mitigar las consecuencias que afectan la ejecución del contrato y/o las actividades que deban ser ejecutadas para lograr su mitigación o evitar su eventual ocurrencia, así como los posibles costos asociados a estas actividades.

Este informe debe contener además de las observaciones que considere el Interventor mínimo la siguiente información:

MONITOREO Y REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS											
No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	A quien se asigna		Tratamiento / control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha en que se inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento	Actividades de seguimiento al tratamiento y control por parte de la interventoría (describir las actividades)	Mejoras propuestas por la interventoría a los tratamientos y controles definidos
				INVIAS	Contratista						

5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

El Interventor debe presentar el informe de avance de otros programas y aplicativos exigidos en el pliego de condiciones del contrato de obra y del contrato de interventoría o solicitados por el INVIAS.

El Interventor debe informar las actividades de seguimiento adelantadas para el trámite y aprobación de los planos de estudios y diseños así como de los planos record realizados por el contratista. Así mismo debe informar el estado del trámite realizado por el Contratista ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que el sistema de referenciación que se está utilizando para la elaboración de los planos es compatible con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

6. Reportes ejecución mensual contrato de Interventoría:

6.1. Equipo y vehículos Contrato de Interventoría. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-5.** En el cual el Interventor lleva el registro diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el mes respectivo, el Supervisor del Contrato de Interventoría verifica la disponibilidad, estado y fechas de calibración del equipo exigido en el pliego de condiciones (A= Activo, R= En reparación, I= Inactivo).

Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

El Interventor debe relacionar el equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie.

Es responsabilidad de la interventoría el cumplimiento de la disponibilidad de los equipos y vehículos exigidos contractualmente para el control y seguimiento del proyecto.

En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría, debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-7**. En el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría hacen el seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones y la propuesta económica aceptada por el Instituto. Se dejará constancia

de todas las aclaraciones y evidencias de la utilización del personal, de tal forma que se mantenga indemne al Instituto frente a cualquier posible reclamación.

Igualmente el Interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría verifican el pago de los aportes legales y seguridad social efectuadas por el Interventor en desarrollo del contrato, según la normatividad vigente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

6.3. Información financiero y presupuestal Contrato de Interventoría. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-9**. En el cual el Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben llevar el control financiero y presupuestal e indicar las acciones que conlleven de forma proactiva a la ejecución del contrato, con el fin de que se ejecuten los recursos asignados para cada vigencia.

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Este formato se diligencia por año.

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-13.** En el cual el Interventor y el Supervisor del contrato de Interventoría realizan el seguimiento a las garantías del contrato y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad en la plataforma del SECOP.

El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. Formato **MEPI-MN1-IN-15-FR-15.** En el cual el Interventor realiza el seguimiento y verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de interventoría a través del área de calidad definido para el contrato.

6.6. Otros documentos seguimiento mensual:

- Seguimiento a la inversión del Anticipo. En el informe se debe incluir copia del Plan de Inversión del anticipo mensualizado Contrato de interventoría. (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1), el Supervisor del Contrato de interventoría y el Interventor deben registran los movimientos detallados de la utilización del anticipo controlando su saldo mensual y el reintegro de los rendimientos causados, registrando en el formato los generados en el mes anterior al mes del informe (Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2).

  El Interventor debe presentar en sus Informes mensuales los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

- Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

- Seguimiento al Plan de Cargas. Se debe anexar copia del Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado vigente (Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2).

7. **Conclusiones y recomendaciones**: El Interventor debe manifestar las conclusiones relevantes sobre el estado del contrato de obra y de interventoría.

   Igualmente debe presentar las recomendaciones a implementar por parte del Contratista de obra para subsanar las deficiencias presentadas e informar las acciones que adelanta o adelantará la Interventoría para lograr que dichas recomendaciones se lleven a cabo.

   Las actuaciones que adelante la interventoría deben garantizar el cumplimiento de las obras del objeto contratado y salvaguardar a la Entidad.

8. **Anexos**

   8.1. Relación de la correspondencia generada entre Contratista e Interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. Es responsabilidad del Interventor dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes formuladas por el Contratista.

   8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras de máximo 15 minutos.

   8.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas de máximo 15 minutos (cuando el contrato tenga que adelantar estas gestiones).

   8.4. Bitácora del mes correspondiente: Este informe debe contener todos los sucesos y acontecimientos que se presenten durante el mes correspondiente de la ejecución del contrato, así como instrucciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra durante el mismo periodo.

5 CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de Diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-13 y Formatos que reemplazan MSE-FR-21, MSE-FR-22 (series 1-12) y se realizan 2 formatos nuevos.
1	Enero de 2022	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-15 y Formatos que reemplazan MINFRA-MN-IN-15-FR-1, MINFRA-MN-IN-15-FR-2, MINFRA-MN-IN-15-FR-3, MINFRA-MN-IN-15-FR-4, MINFRA-MN-IN-15-FR-5,

		MINFRA-MN-IN-15-FR-6, MINFRA-MN-IN-15-FR-7, MINFRA-MN-IN-15-FR-8, MINFRA-MN-IN-15-FR-9, MINFRA-MN-IN-15-FR-10, MINFRA-MN-IN-15-FR-11, MINFRA-MN-IN-15-FR-12, MINFRA-MN-IN-15-FR-13, MINFRA-MN-IN-15-FR-14, MINFRA-MN-IN-15-FR-15, MINFRA-MN-IN-15-FR-16, MINFRA-MN-IN-15-FR-17 y MINFRA-MN-IN-15-FR-18.
